

# ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS



**“Planificación de una ciudad región con visión amplia, sostenible e innovadora”**

Arquitecto Miguel Peñaranda Director AMC



**SEMANA MARTES 16 DE  
AGOSTO AL SÁBADO  
20 DE AGOSTO**

- ✓ Entrega de presupuestos hidrosanitarios
- ✓ Entrega de alternativa combinada alcantarillado pluvial y cuneta.
- ✓ Continuación de mantenimiento vial, vías alternas sector 1.
- ✓ Estudio sobre alternativa de iniciar sector Av. libertadores.
- ✓ Llegada de primer pedido de tubería alcantarillado pluvial.
- ✓ Inicio de instalación de Cerramiento del área del sector 1.



# ¡Así vamos!

En la semana del 08 al 12 de agosto ejecutamos:

## Sector 1 de intervención:

### Desde Glorieta Palustre hasta calle 5 semáforo

Se iniciaron los trabajos de mejoramiento de vías alternas que afectan el sector 1 de inicio de actividades en ambos sentidos.




✓ Se realizó recorrido de campo y verificación de áreas a intervenir.


✓ Instalación de señalización de acuerdo con el PMT propuesto en las vías alternas.

✓ Se realizó corte de pavimento, excavaciones y retiro de material, instalación de base granular.

# Vías alternas

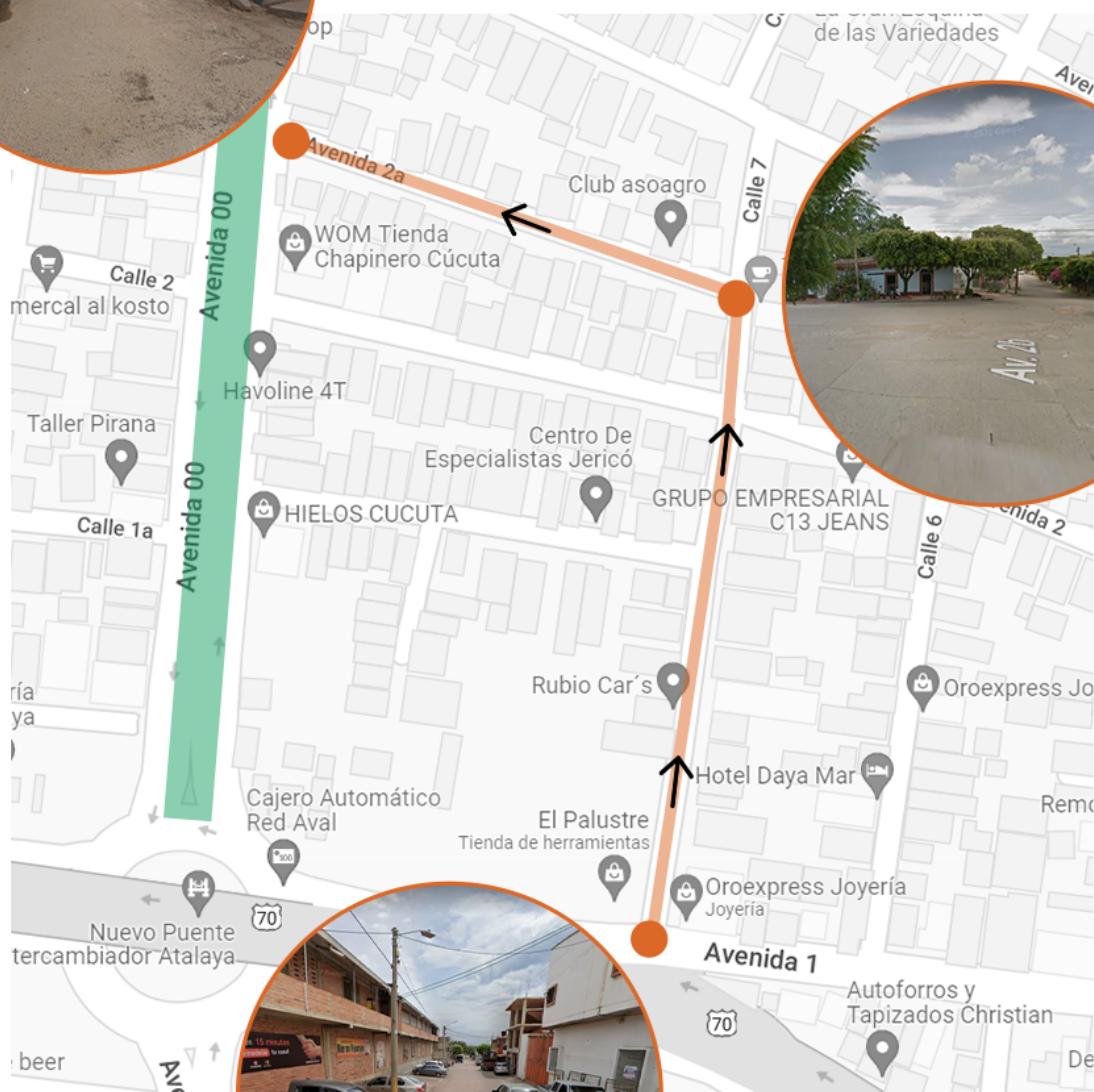

- Tramo de intervención
- Vías alternas  
Sentido Sur - Norte

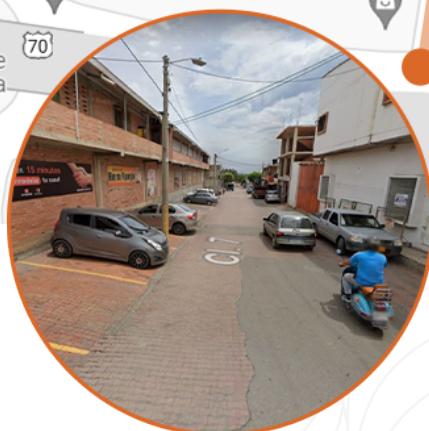

# Vías alternas

## ● Tramo de intervención

### ● Vías alternas Sentido Norte - Sur





# AMC.



Área Metropolitana  
de Cúcuta.



**ALCALDÍA  
DE SAN JOSÉ DE  
CÚCUTA**



[www.amc.gov.co](http://www.amc.gov.co)

