

ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS



**“Planificación de una ciudad región con
visión amplia, sostenible e innovadora”**

Arquitecto Miguel Peñaranda Director AMC



**¡RENOVACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE LA
AV LAS AMÉRICAS, UN
ESPACIO PARA TODOS!**

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA INFORME: 30/09/2022

<div><div><div>AMC.</div><div>Area Metropolitana de Cúcuta. ▶▶▶▶▶▶▶▶</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>CENTRO DE PENSAMIENTO URBANO</div></div></div> <th colspan="26">AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA</th>			AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA																									
			PROGRAMACION DE PROYECTOS																									
PROYECTO	FASE	ACTIVIDAD	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23		
AV. LAS AMERICAS	1	ESTUDIOS Y DISEÑOS																										
	2	EJECUCIÓN DE OBRA																										
	3	ENTREGA																										

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE OBRA	ENTREGA
-----------	-------------------	---------

FECHA DE INICIO:
22 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATISTA:
UT VIA PANAMERICANA

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA: \$0

VALOR TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA:
\$16.595.974.828.

CONVENIO:
2837



Semanas totales del proyecto 56 SEMANAS
Semana de ejecución SEMANA 6



En este momento se está trabajando en el tramo ubicado sobre la avenida doble cero, desde la calle octava hasta la curva del pescado, que corresponden a la primera etapa de este proyecto.


¿Qué está pasando en la obra de la Av Las Americas?



200 mts
Lineales de tubería pluvial instalada

A causa de la ola invernal en la Av. Américas, el contratista de obra utilizó, en el proceso constructivo, un concreto con acelerante para mejorar el fraguado y lograr un secado más eficiente para las bases de los pozos pluviales, el cual es un gran beneficio para la estabilidad de la obra, y así, no generar más atrasos.





Se realizaron actividades de instalación de la estructura en acero de los respectivos pozos pluviales.



¡En Las Américas, trabajamos de la mano de la comunidad!

El día 28 de septiembre, dando seguimiento al compromiso con la comunidad, el contratista de obra instaló la oficina del punto de atención al ciudadano, ubicado en la Av 00 calle 6-66




El día 30 de septiembre se realizó reunión con los principales involucrados en la ejecución de la obra, en compañía de la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Área Metropolitana, esto, con el objetivo de escuchar las sugerencias y requerimientos de los implicados y encontrar posibles soluciones




¿En qué vamos a trabajar la próxima semana?

- Continuar con el armado de la estructura de acero de los pozos pluviales
- Fundir en concreto reforzado las paredes de los pozos pluviales

Vías alternas

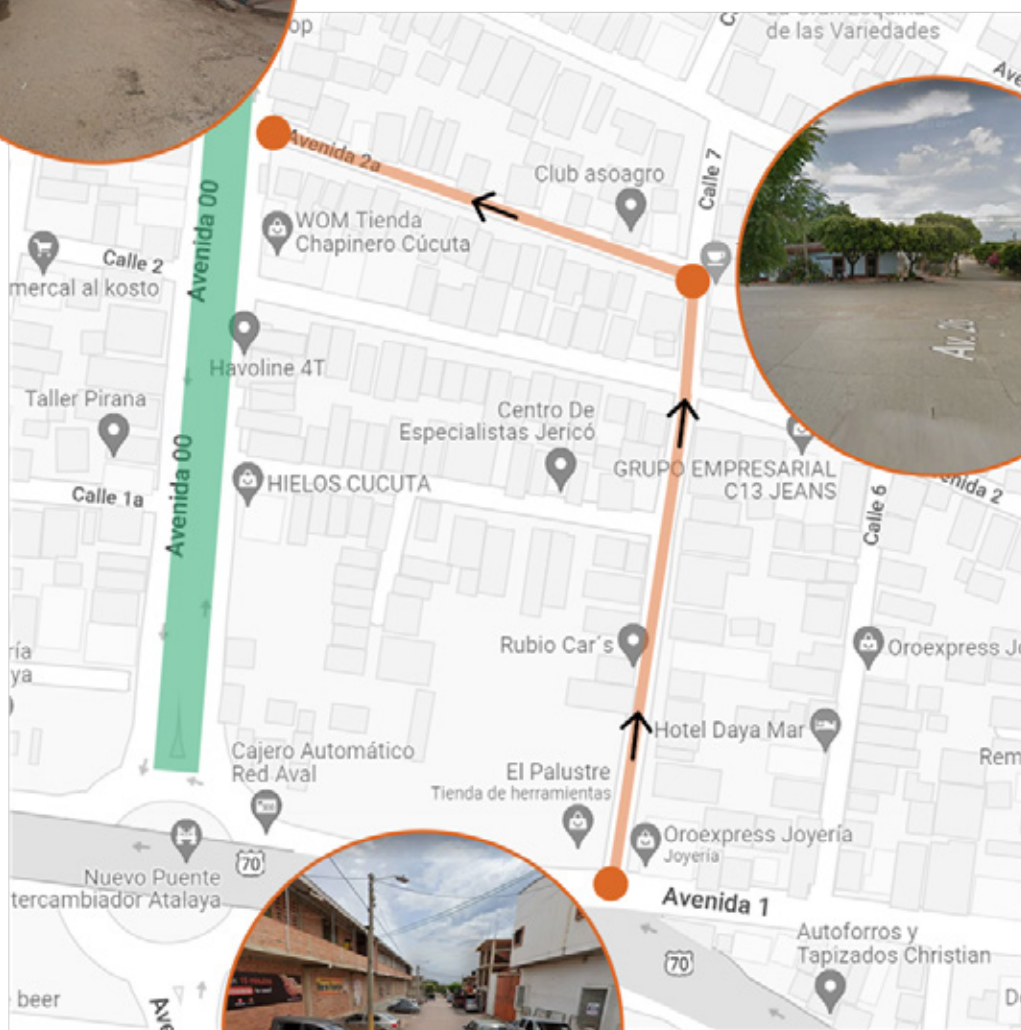

● Tramo de intervención
● Vías alternas
Sentido Sur - Norte

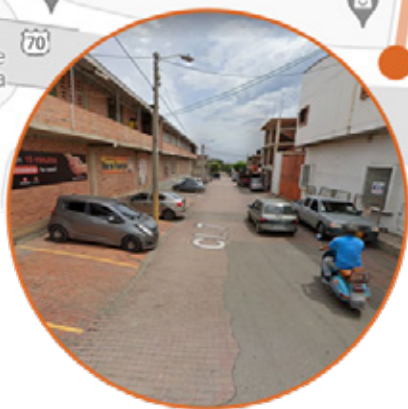

Vías alternas

● Tramo de intervención

● Vías alternas
Sentido Norte - Sur





**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



www.amc.gov.co

