

ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS



“Planificación de una ciudad región con visión amplia, sostenible e innovadora”

Arquitecto Miguel Peñaranda Director AMC




¡RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA AV LAS AMÉRICAS, UN ESPACIO PARA TODOS!

Informe de actividades del 11 al 17 de marzo

¿SABÍAS QUÉ LA OBRA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS SE DIVIDE EN DOS ETAPAS? ¡AQUÍ TE LAS EXPLICAMOS!

La obra de Renovación Urbana de la Avenida Las Américas, comprende el tramo ubicado desde la **Avenida Libertadores**, ▲, pasando por la **Curva del Pescado**, ●, hasta el puente **Intercambiador Juan Atalaya**. ■

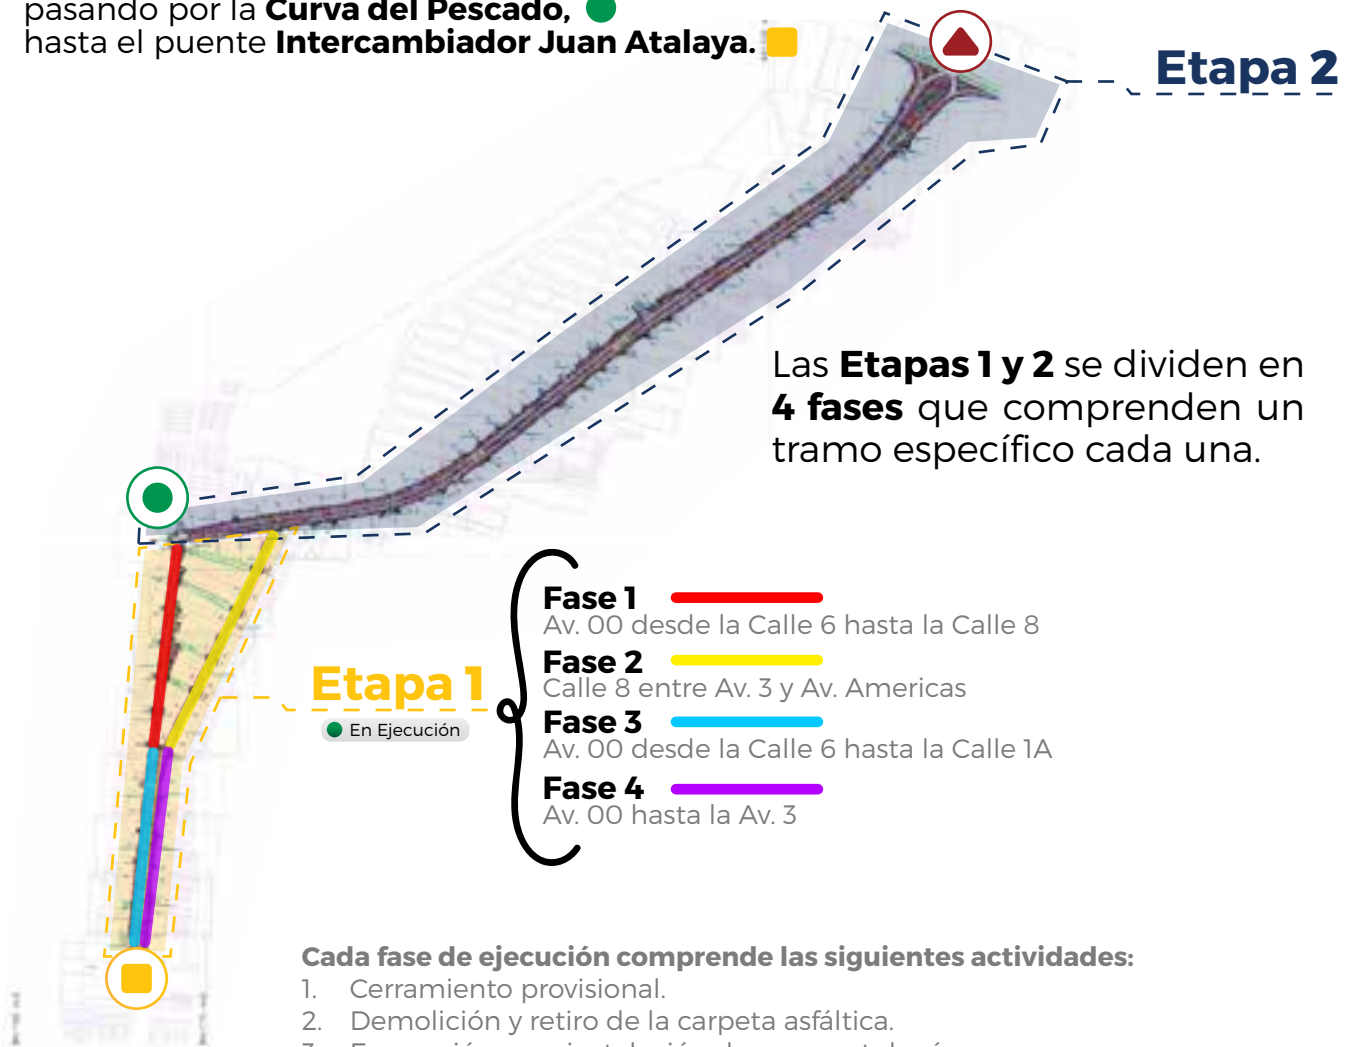

Las **Etapas 1 y 2** se dividen en **4 fases** que comprenden un tramo específico cada una.

- Fase 1** — Av. 00 desde la Calle 6 hasta la Calle 8
- Fase 2** — Calle 8 entre Av. 3 y Av. Americas
- Fase 3** — Av. 00 desde la Calle 6 hasta la Calle 1A
- Fase 4** — Av. 00 hasta la Av. 3

Cada fase de ejecución comprende las siguientes actividades:

1. Cerramiento provisional.
2. Demolición y retiro de la carpeta asfáltica.
3. Excavación para instalación de pozos y tuberías.
4. Instalación de tuberías, relleno y compactación de tuberías.
5. Realización de la base y la sub base de la vía.
6. Pavimentación.
7. Demarcación vial.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AMC. CENTRO DE PENSAMIENTO URBANO		AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA																					
		PROGRAMACION DE PROYECTOS																					
PROYECTO	ACTIVIDAD	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	
		1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	53	54	55	56	57	63	68	72	76	81
AMERICAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS																						
	EJECUCIÓN DE OBRA																						
	ENTREGA																						

NOTA: El contratista de obra realizó la solicitud de adicional para culminar el proyecto, la cual se encuentra en estudio para aprobación por parte de la interventoría. Al ser aprobado este adicional, se ampliaría el tiempo de ejecución del proyecto de la siguiente manera:


AMC. CENTRO DE PENSAMIENTO URBANO		AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA																						
		PROGRAMACION DE PROYECTOS																						
PROYECTO	ACTIVIDAD	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	
		1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	53	54	55	56	57	63	68	72	76	81	86
AMERICAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS																							
	EJECUCIÓN DE OBRA																							
	ENTREGA																							

Cronograma proyectado con el adicional ↗



Faltan 133 días para terminar la ejecución ⏳

INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

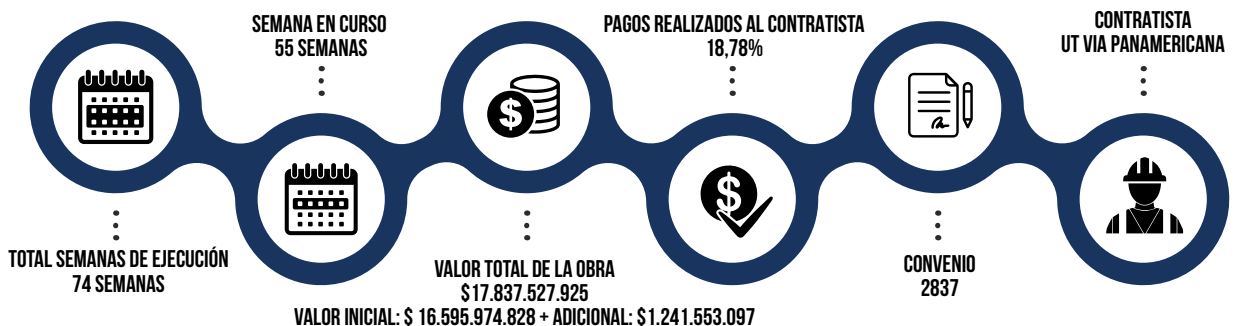



¿En qué estamos trabajando?

En este momento se están trabajando en la **Fase 1, Fase 2, Fase 3 y Fase 4** de la **Etapa 1** del proyecto.




435 mts
de tubería pluvial instalada



215 mts
pavimentados

En este momento se entregan pavimentados los primeros 215 metros correspondientes a la primera parte de la fase 1 de la etapa 1, la cual está ubicada en la avenida doble cero, desde la calle octava hasta la curva del pescado. Esta primera fase contempla todo el cambio de tubería sanitaria y pluvial con sus respectivos sumideros y entrega de carpeta asfáltica con sardineles.



La demarcación vial se realizará al momento de la entrega total del proyecto.



¿QUE INCONVENIENTES SE HAN PRESENTADO?

DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS, SE RETRASARON LAS ACTIVIDADES QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE ESTÁN REALIZANDO EN LA SEGUNDA PARTE DE LA FASE 1 DE LA ETAPA 1? <<<



✓ Se realiza toma de temperatura del asfalto para ver la calidad del material.



✓ Se realiza la instalación de asfalto,

¿QUÉ HACE EL FRENTE DE TRABAJO EN LA FASE 2?



✓ Se continúa con la instalación de tubería sanitaria.



✓ Se continúa con el relleno de compactación para instalación de tubería sanitaria.



✓ Se continúa con el encofrado de sumideros pluviales.



✓ Se continúa con la conexiones para acometidas domiciliarias.



✓ Se realiza la tomas de ensayos de compactación.

¿QUÉ HACE EL FRENTE DE TRABAJO EN LA FASE 3?




✓ Se realiza excavación a máquina para llegar a sub rasante de pavimento.



✓ Se realiza demolición de pavimento existente a máquina para llegar a Subrasante de pavimento.

¿QUÉ HACE EL FRENTE DE TRABAJO EN LA FASE 4?



✓ Se realiza el corte de la carpeta asfáltica existente.



✓ Se inicia con el retiro de carpeta asfáltica.



EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA AMC, ESTÁ COMPROMETIDA CON LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

El día 16 de marzo, se reunieron en las instalaciones del proyecto el Subdirector de Ordenamiento Territorial AMC Alvaro Luis Alvarez, personal de Aguas Kpital y contratistas de obra e interventoría, con el fin de dar claridad a los inconvenientes presentados en el desarrollo del proyecto con el cruce de tuberías que impiden seguir con la instalación de tubería pluvial.

Actividades programadas para la semana del 13 de Marzo al 18 de marzo:

- Se continuará con la fundida de pozos pluviales para la fase 2 .
- Se continuará con la instalación de carpeta asfáltica de la fase 1.
- Se continuará con el armado de sumideros de la fase 4.
- Se continuará con la compactación de base y sub base de la fase 3.

ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS



● Tramo de intervención
● Vías alternas
Sentido Sur - Norte



● Tramo de intervención

● Vías alternas Sentido Norte - Sur





AMC.  Área Metropolitana
de Cúcuta.



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



www.amc.gov.co

