

# ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS



**“Planificación de una ciudad región con visión amplia, sostenible e innovadora”**

Arquitecto Miguel Peñaranda Director AMC




## ¡RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA AV LAS AMÉRICAS, UN ESPACIO PARA TODOS!

Informe de actividades del 25 al 3 de febrero

## ¿SABÍAS QUÉ LA OBRA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS SE DIVIDE EN DOS ETAPAS? ¡AQUÍ TE LAS EXPLICAMOS!

La obra de Renovación Urbana de la Avenida Las Américas, comprende el tramo ubicado desde la **Avenida Libertadores**, ▲, pasando por la **Curva del Pescado**, ●, hasta el puente **Intercambiador Juan Atalaya**. ■

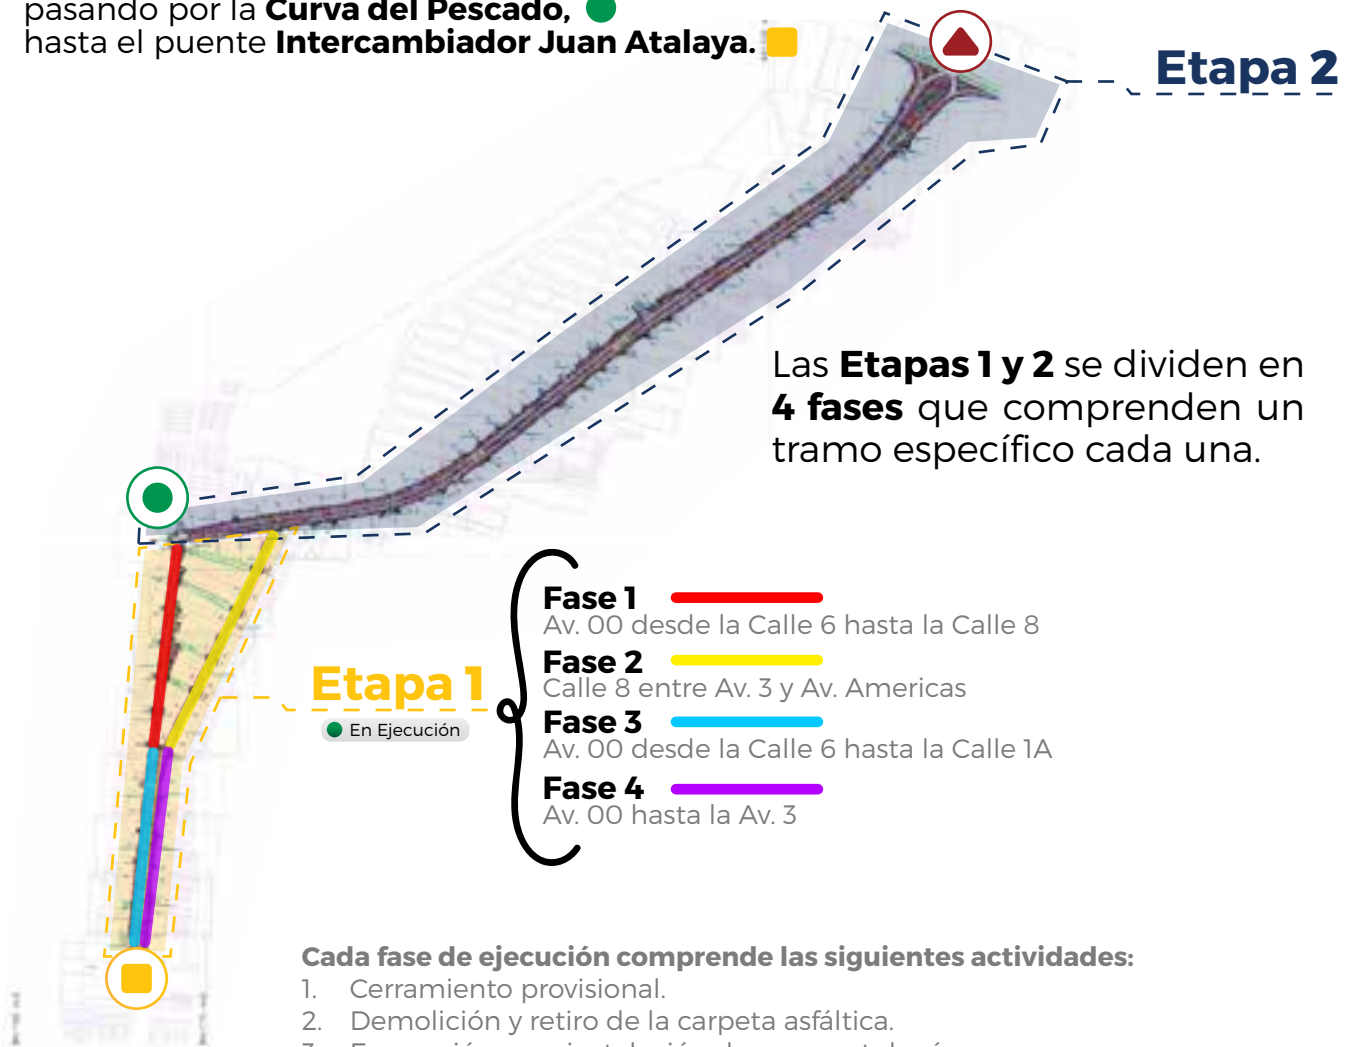



Las **Etapas 1 y 2** se dividen en **4 fases** que comprenden un tramo específico cada una.

- Fase 1** — Av. 00 desde la Calle 6 hasta la Calle 8
- Fase 2** — Calle 8 entre Av. 3 y Av. Americas
- Fase 3** — Av. 00 desde la Calle 6 hasta la Calle 1A
- Fase 4** — Av. 00 hasta la Av. 3



### Cada fase de ejecución comprende las siguientes actividades:

1. Cerramiento provisional.
2. Demolición y retiro de la carpeta asfáltica.
3. Excavación para instalación de pozos y tuberías.
4. Instalación de tuberías, relleno y compactación de tuberías.
5. Realización de la base y la sub base de la vía.
6. Pavimentación.
7. Demarcación vial.

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


 		AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA																							
		PROGRAMACION DE PROYECTOS																							
PROYECTO	ACTIVIDAD	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23			abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	
		1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	53	54	55	56	57	63	68	72	76	81	86	
KENNEDY	ESTUDIOS Y DISEÑOS	[Shaded cells]																							
	EJECUCIÓN DE OBRA	[Shaded cells]																							
	ENTREGA	[Shaded cells]																							

**NOTA:** El contratista de obra realizó la solicitud de adicional para culminar el proyecto, la cual se encuentra en estudio para aprobación por parte de la interventoría. Al ser aprobado este adicional, se ampliaría el tiempo de ejecución del proyecto de la siguiente manera:

 		AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA																							
		PROGRAMACION DE PROYECTOS																							
PROYECTO	ACTIVIDAD	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23			abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
		1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	53	54	55	56	57	63	68	72	76	81	86	90
AMERICAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS	[Shaded cells]																							
	EJECUCIÓN DE OBRA	[Shaded cells]																							
	ENTREGA	[Shaded cells]																							

Cronograma proyectado con el adicional ↗



Faltan 152 días para terminar la ejecución 





## ¿En qué estamos trabajando?

En este momento se están trabajando en la **Fase 1, Fase 2, Fase 3 y Fase 4** de la **Etapa 1** del proyecto.




**290 mts**  
de tubería pluvial instalada



**190 mts**  
pavimentados

En este momento se entregan pavimentados los primeros 190 metros correspondientes a la primera parte de la fase 1 de la etapa 1, la cual está ubicada en la avenida doble cero, desde la calle octava hasta la curva del pescado. Esta primera fase contempla todo el cambio de tubería sanitaria y pluvial con sus respectivos sumideros y entrega de carpeta asfáltica con sardineles.



La demarcación vial se realizará al momento de la entrega total del proyecto.

## ¿QUÉ HACE EL NUEVO FRENTE DE TRABAJO EN LA FASE 1?



✓ Conformación de la subrasante



✓ Fundida y vibrado de tapa sumidero S-96



✓ Excavación caja estructura de pavimento K2+060



✓ Instalación de tubería de 12" del Sumidero S-41 al pozo HM-226.



✓ Excavación manual para profundizar tubería de gas muy superficial.



✓ Toma de la 2da densidad, 1ra capa de base.



✓ Céreo de la 2da capa de base, PR 1+910 - 1+980.



✓ Chequeo de niveles de la intersección #3.

## ¿QUÉ HACE EL NUEVO FRENTE DE TRABAJO EN LA FASE 2?



✓ Instalación de tubería sanitaria, y lleno con triturado,



✓ Excavación para instalación de tubería sanitaria.



✓ Fundida y Vibrado MH -12.



✓ Excavación para acometidas.

## ¿QUÉ HACE EL NUEVO FRENTE DE TRABAJO EN LA FASE 3?



- ✓ Instalación de tubería de 12" del Sumidero S-116 al. Pozo MH-203 con su respectivo colchón de gravilla.



- ✓ Excavación para instalación de tubería pluvial de 12" del sumidero 116 al pozo 205.



- ✓ Excavación manual para verificación de cruces entre las tuberías de gas y pluvial de 12".



- ✓ Perforación de sum 116 para instalación de tubería.





✓ Replanteo de anchos de vía.



✓ Replanteo de anchos de vía.

## ¡SE INICIARON TRABAJOS EN LA FASE 4!



✓ Instalación de cerramiento de obra.



✓ Amarre de acero de refuerzo sumideros de aguas lluvia.



✓ Excavación para tubería de 12 pulg de los sumideros s 113 y s88 al pozo 201.



✓ Excavación para tubería de 12 pulg de los sumideros s 113 y s88 al pozo 201.



## EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA AMC, ESTÁ COMPROMETIDA CON LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO


El día 3 de marzo el Subdirector de Ordenamiento Territorial AMC Alvaro Luis Alvarez y contratistas de obra e interventoría, se reunieron en las instalaciones del AMC con el fin de dar claridad a los inconvenientes presentados en el desarrollo del proyecto.

### Actividades programadas para la semana del 6 de Marzo al 11 de marzo:

- Se continuará con la fundida de pozos pluviales
- Se continuará con la excavación de la fase 1 y 2 para iniciar a instalar tubería.
- Se continuará con el cerramiento provisional fase 2
- Se continuará con el armado de sumideros de la fase 3
- Se continuará con el cambio de tubería sanitaria de la fase 1 y 3
- Se continuará con la compactación de base y sub base de la fase 1.

# ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS

**¡Ojo!**  
Estas son las vías  
alternas que  
puedes tomar

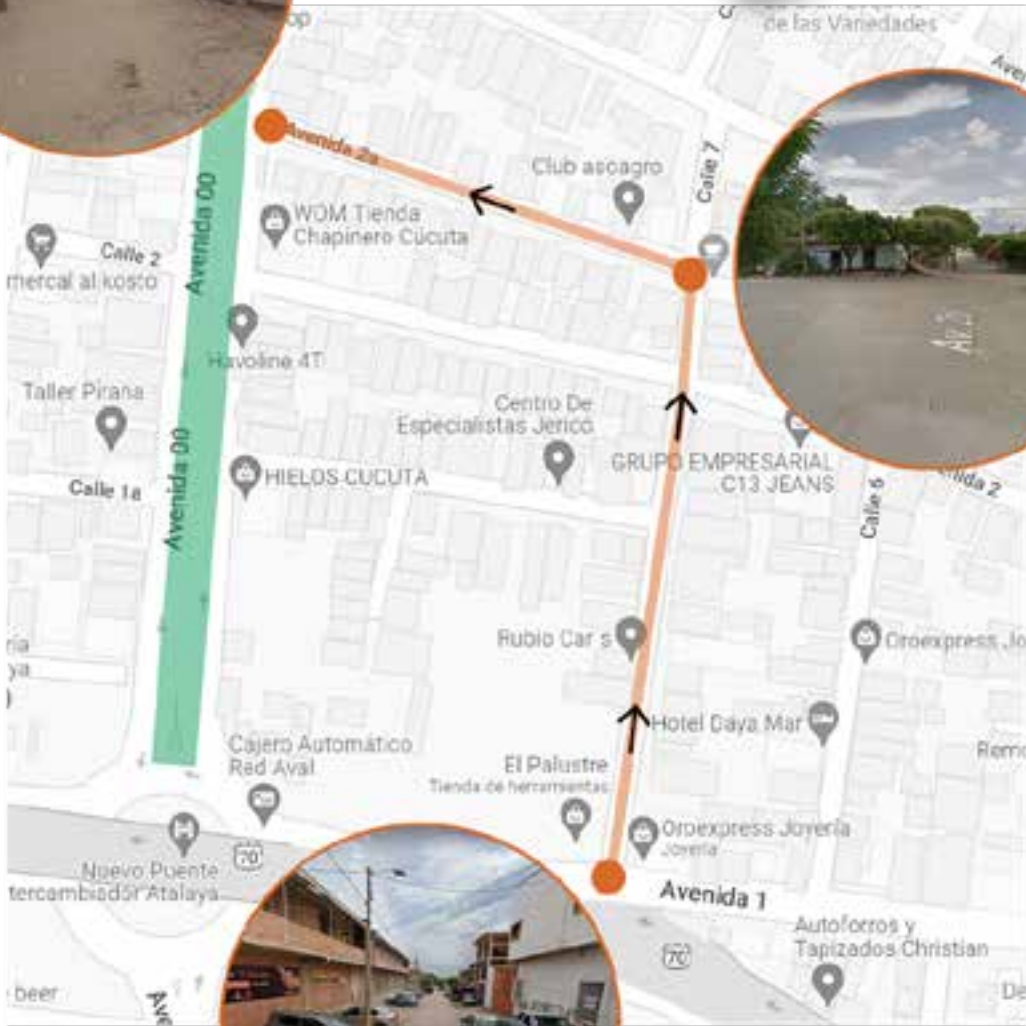

● **Tramo de intervención**  
● **Vías alternas**  
**Sentido Sur - Norte**

## ● Tramo de intervención

## ● Vías alternas Sentido Norte - Sur





**AMC.**  Área Metropolitana  
de Cúcuta.



**ALCALDÍA  
DE SAN JOSÉ DE  
CÚCUTA**



[www.amc.gov.co](http://www.amc.gov.co)

