

ASÍ VAN NUESTRAS OBRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS



Boletín 35

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 10 AL 16 DE JUNIO

**EL COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO
GUAIMARAL Y EL COLEGIO MANUEL
ANTONIO FERNÁNDEZ DE NOVOA
SEDE REYES MANTILLA**

**Están en un 95% de avance y pronto contarán
con baterías sanitarias renovadas.**



MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN



VALOR TOTAL OBRA

5.953 MILLONES
DE PESOS

FECHA DE ENTREGA

05 DE SEPTIEMBRE
DE 2023

CONTRATISTA

 **UNIÓN TEMPORAL
CUCUTA BELÉN**

¿QUE ACTIVIDADES SE ESTÁN REALIZANDO?





Mampostería en ladrillo estructural para zona de cafetería.



Mortero de nivelación de los laboratorios de la segunda planta.



Instalación de dovelas para mampostería estructural de la fachada.



Construcción de mampostería en ladrillo estructural para la fachada del proyecto.



Instalación de tuberías eléctricas en los laboratorios de la segunda planta.



Se continúa con la instalación de contrapiso en concreto.



Corte y figurado de acero de columnetas.




¿QUÉ VA A PASAR LA PRÓXIMA SEMANA?

- Construcción de muros en ladrillo a la vista multiperforado.
- Construcción de muros en ladrillo estructural.
- Construcción de fachada en ladrillo estructural del proyecto.
- Instalaciones eléctricas de los diferentes niveles del proyecto.
- Construcción de pañetes.
- Construcción de ante piso.
- Fundida de la placa de contrapiso del proyecto.



BATERIAS SANITARIAS

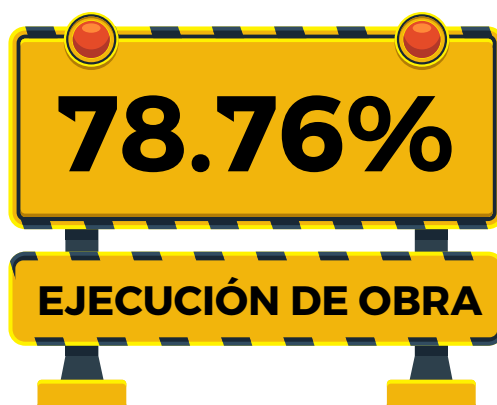

VALOR TOTAL OBRA

5.497 MILLONES
DE PESOS

FECHA DE ENTREGA

26 DE JUNIO
DE 2023

CONTRATISTA



**CONSORCIO
EDUANITARIA NDS**

¿DÓNDE ESTAMOS TRABAJANDO?

 **COL. ALEJANDRO GUTIÉRREZ CALDERÓN**
Sede Principal

 **INST. TEC. GUAIMARAL**
Sede Hermógenes Maza

 **COL. SAN JOSÉ DE CÚCUTA**
Sede Principal

 **COL. JAIME GARZÓN**
Sede Pablo VI #43

 **COL. JAIME GARZÓN**
Sede principal

 **COL. MARIANO OSPINA**
Sede Esc. Urb. José Celis

 **COL. MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA**
Sede Los Alpes

 **COL. MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA**
Sede Esc. Reyes Mantilla N°14

 **COL. PABLO NERUDA**
Escuela La Gruta N°6

 **COL. GREMIOS UNIDOS**
Sede Cent. Educ. 18 de Mayo



NOTA IMPORTANTE

De las 20 construcciones de baterías del contrato 09/2021 ya están terminadas 4 baterías como son; colegio Espíritu Santo, Eustorgio Colmenares, Daniel Jordán y Toledo Plata. Quedando 16 en ejecución.



COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ DE NOVOA - LOS ALPES

Se encuentran realizando impermeabilizando placa, construcción de canal de aguas lluvias en concreto, la próxima semana continuación construcción del gavión.

Para la siguiente semana se tiene programada la continuación de construcción del gavión.




Personal en obra: 1 oficial y 3 ayudantes.

COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO GUAIMARAL SEDE HERMÓGENES MAZA

Se encuentran en instalación de gargolas, instalación de rejilla de ventilación en fachada, instalación de lámparas led, terminación de bordillo rampa y conexión a la tubería de aguas kpital.

La siguiente semana se tiene programada la instalación de aparatos sanitarios, grifería y pintura.

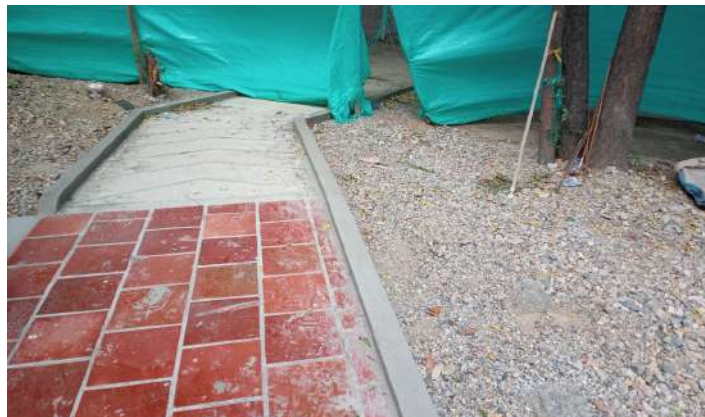

Personal en obra: 1 oficial y 2 ayudante, 1 pintor.

COLEGIO GREMIOS UNIDOS SEDE 18 DE MAYO

Se encuentra realizando pañetes sobre muros, dilataciones, morteros de nivelación e instalación tubería de aguas negras e hidráulicas sobre muros.

Para la siguiente semana se continuará con pañetes y morteros.

Personal: 1 maestro, 2 oficiales y 3 ayudantes.



COLEGIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SEDE PRINCIPAL

Se encuentran instalando pasta sobre muros exteriores e interiores, construcción antepiso fachada posterior e instalación de pañetes sobre placa.

Para la siguiente semana se tiene programada instalación de pañetes fachada posterior y morteros de nivelación.



Personal en obra: 3 oficiales y 3 ayudantes.

COLEGIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ

CALDERÓN SEDE PRINCIPAL

Ya se encuentra la construcción del piso exterior y se colocaron las puertas de la entrada de las baterías.

Personal en obra: 1 oficial, 2 ornamentador y 3 ayudantes.



COLEGIO JAIME GARZÓN

SEDE PRINCIPAL

Se Finaliza adecuación de cubierta y se adecuan puntos de lavamanos en baños niños.

Para la próxima semana se tiene programada iniciar con la instalación de enchape.

Personal en obra: 1 oficial y 2 ayudantes.



COLEGIO PABLO NERUDA

SEDE ESCUELA LA GRUTA N6

Se realiza instalación de enchape sobre muros y pasta sobre muros.

Próxima semana instalación de aparatos sanitarios.



Personal en obra: 1 oficial, 1 ayudante.

COLEGIO MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ SEDE ESCUELA URBANA JOSÉ BARTOLOMÉ CELIS.

Se continua con instalación de pañete de muros internos y dilataciones.

Siguiente semana continuar con instalación de pañetes.



Personal en obra: 1 oficial
y 1 ayudante.

COLEGIO JAIME GARZÓN SEDE PABLO VI #43

Se encuentran instalando aparatos sanitarios e impermeabilización de cubierta.




Para la siguiente semana se estima instalar carpintería metálica e instalación de mesones en granito.

Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante.

COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ DE NOVOA SEDE REYES MANTILLA.

Se encuentran en la terminación de pintura de muros interiores, e instalación de sanitarios.

Para la siguiente semana se tiene programada la instalación de tableta de gres patio y continuación instalación de aparatos sanitarios.

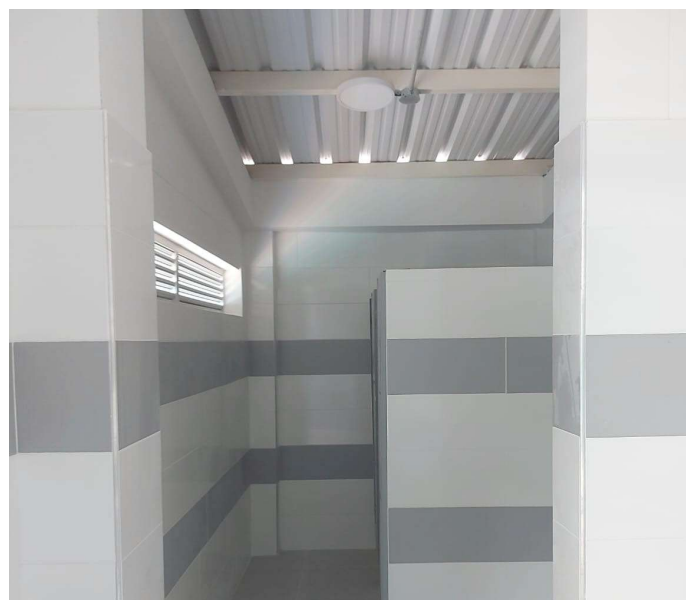

Personal en obra: 1 pintor y 2 plomeros.

ASÍ VAN OBRAS NUESTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

www.amc.gov.co



AMC. 
Área Metropolitana
de Cúcuta.



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

