




ASÍ VAN NUESTRAS OBRAS ESPACIO PÚBLICO

X
X
X

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 4 AL 10 DE MARZO

¡Renovación urbana Avenida Kennedy


¿DÓNDE ESTÁ UBICADO EL PROYECTO?

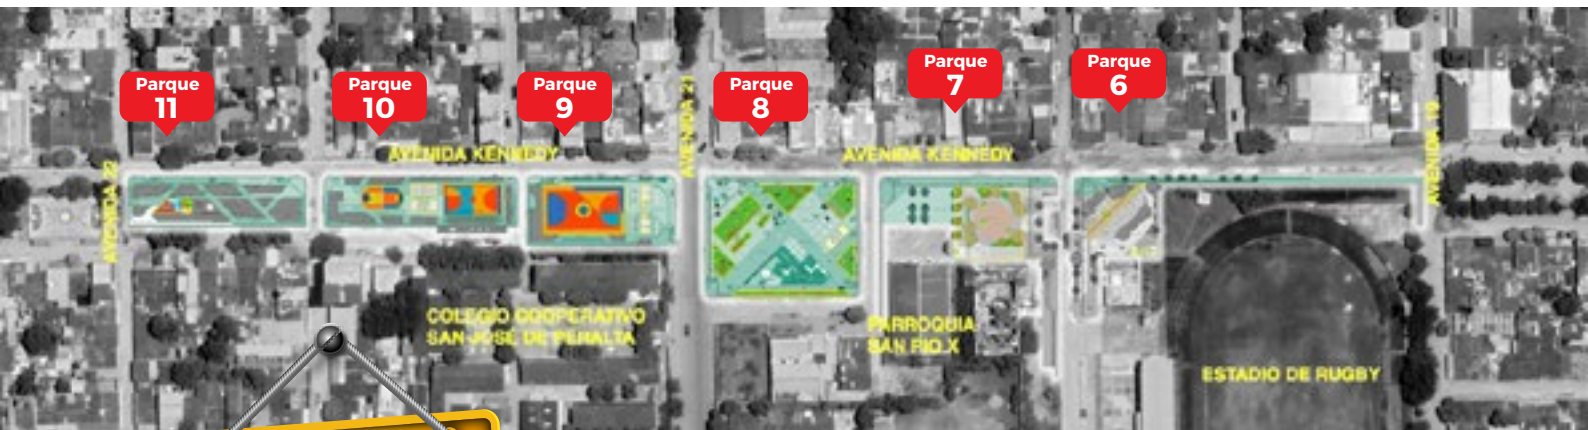

Faltan 56 días para
terminar la ejecución




CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

		AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA																										
		PROGRAMACION DE PROYECTOS																										
PROYECTO	ACTIVIDAD	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23			mar-23						abr-23	may-23	jun-23
		1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	53	57	63	67	68	69	70	71	72	76	81				
KENNEDY	ESTUDIOS Y DISEÑOS																											
	EJECUCION DE OBRA																											
	ENTREGA																											

*ESTE CRONOGRAMA ESTA PRESTO A SER MODIFICADO SEGÚN LA NECESIDAD DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

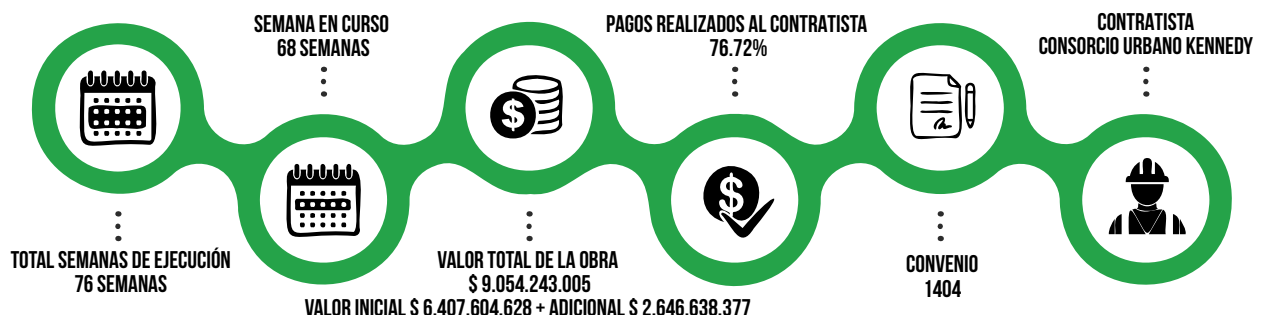

¿EN QUÉ SE ESTÁ TRABAJANDO?



✓ Se continúa con instalación de adoquín en el parque 4.



✓ Se Realiza el corte de raíces de arboles, para la instalación de bordillo de confinamiento



✓ Se continúa con el bordillo de confinamiento del parque 3.



✓ Se Realiza el corte de raíces de arboles, para la instalación de bordillo de confinamiento.



✓ Se termina la instalación de la tableta podotáctil del parque 5.



✓ Se termina con la instalación de piso encauchetao del parque 5.

PARQUES DEL 6 AL 11

Los parques contratados inicialmente cuentan con un avance de ejecución del 94,72%. Estos parques fueron diseñados para suplir la necesidad de la comunidad de la comuna 8.



✓ Se continúa con la instalación de mampostería de la caseta comercial del parque

¿QUÉ SE HARÁ LA PRÓXIMA SEMANA?

- Se continuará con el descapote de los parques 1
- Se continuará con la instalación de sardinel de los parques 2 y 3
- Se continuará la instalación de adoquín del parque 3 y 4
- Se continuará con la instalación de mampostería de las casetas comerciales de los parques 7
- Se continuará fundiendo la viga de cimentación del parque 3



En **Sevilla** Segunda etapa, pensamos en ti

¿Dónde está ubicado el proyecto?


Este parque se encuentra ubicado en la avenida 7° más conocida como la Avenida Sevilla, al frente de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Esta obra es una de las más importantes ejecutada por el área metropolitana de Cúcuta, ya que se encuentra ubicada en la comuna 5 colindando con cuatro barrios los cuales son: Pescadero, Sevilla, Zona Industrial y La Merced.



Faltan 35 días para terminar la ejecución




CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

<div><div><div>AMC</div><div>Área Metropolitana de Cúcuta</div></div><div></div><div>CENTRO DE PENSAMIENTO URBANO</div></div>		ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA																							
		PROGRAMACION DE PROYECTOS																							
PROYECTO	ACTIVIDAD	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23				abr-23	may-23	jun-23		
		1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	53	57	63	67	68	69	70	71	72	76	81	
KENNEDY	ESTUDIOS Y DISEÑOS																								
	EJECUCIÓN DE OBRA																								
	ENTREGA																								

*ESTE CRONOGRAMA ESTA PRESTO A SER MODIFICADO SEGÚN LA NECESIDAD DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

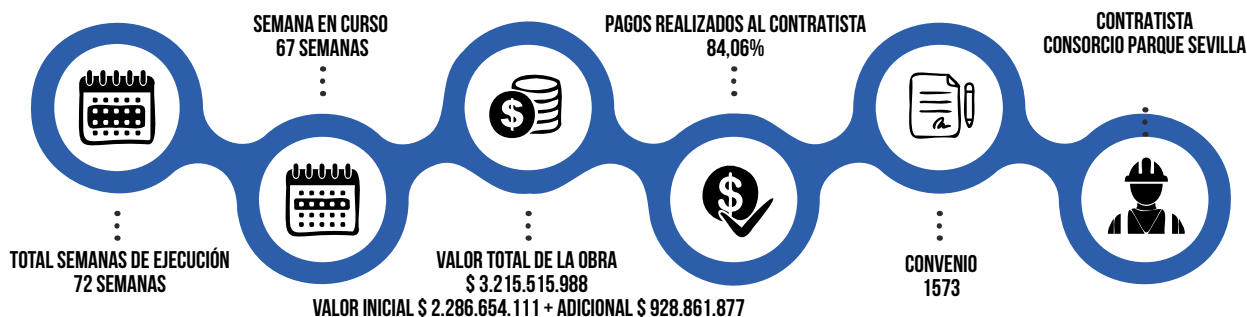

¿ En qué se está trabajando ?



Excavaciones para zapatas de camerinos.



Instalación de base y sub-base para los camerinos.



Construcción rampa para personas con movilidad reducida.



instalación de pintura pasamanos.



Instalación de adoquín.

¿Qué haremos la próxima semana?

- Se iniciará con la construcción de camerinos.
- Se continuará con la construcción de rampas.
- Terminación de instalación de adoquín.

ASÍ VAN OBRAS NUESTRAS ESPACIO PÚBLICO

www.amc.gov.co



AMC.  Área Metropolitana
de Cúcuta.



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

