



# ASÍ VAN NUESTRAS OBRAS ESPACIO PÚBLICO




INFORME DE ACTIVIDADES DEL 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO



# ¡Renovación urbana Avenida Kennedy

## ¿DÓNDE ESTÁ UBICADO EL PROYECTO?

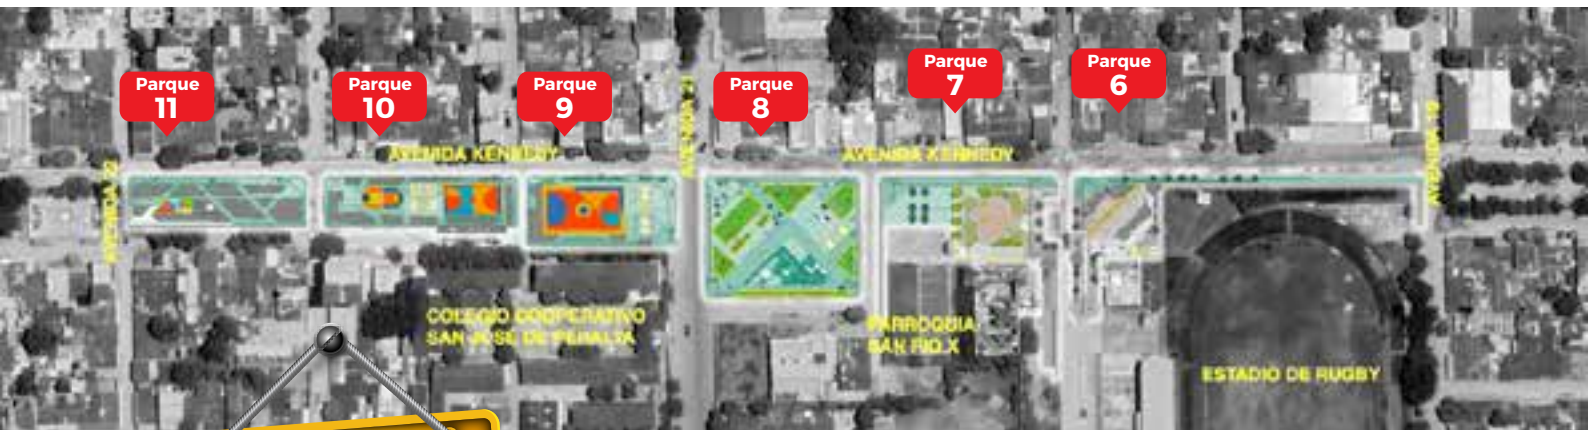

Faltan 63 días para terminar la ejecución




## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AMC. CENTRO DE PENSAMIENTO URBANO		AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA																							
PROGRAMACION DE PROYECTOS																									
PROYECTO	ACTIVIDAD	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23					
		1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	53	57	63	67	68	69	70	71	72	76	81	
KENNEDY	ESTUDIOS Y DISEÑOS																								
	EJECUCIÓN DE OBRA																								
	ENTREGA																								

\*ESTE CRONOGRAMA ESTA PRESTO A SER MODIFICADO SEGÚN LA NECESIDAD DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

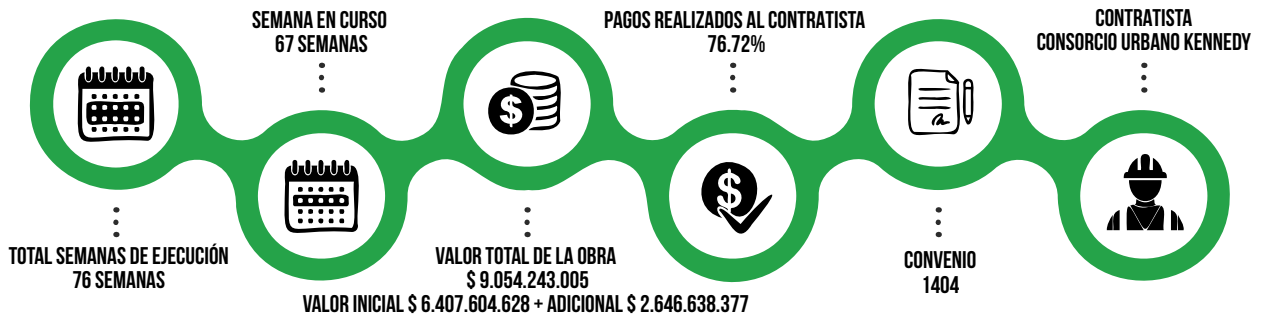

## ¿EN QUÉ SE ESTÁ TRABAJANDO?



✓ Se continúa con instalación del bordillo de confinamiento para el adoquín del parque 2 y 3



✓ Se continúa con el sellado de brechas del adoquín del parque 4.



✓ Se continúa con la instalación de tableta podotáctil en los parque 4 y 5.



✓ Se continúa con la instalación de sardinel de confinamiento de los parques 2 y 3.



✓ Se continúa con la construcción de rampas de acceso del parque 3 y 4.



✓ Se inicia con la instalación de piso encauchetao del parque 5.

# PARQUES DEL 6 AL 11

Los parques contratados inicialmente cuentan con un avance de ejecución del 94,68%. Estos parques fueron diseñados para suplir la necesidad de la comunidad de la comuna 8.



✓ Se funde en concreto las rampas de acceso de los locales comerciales del parque 6.



✓ Se termina con la instalación de mampostería de la caseta comercial del parque 6.

## ¿QUÉ SE HARÁ LA PRÓXIMA SEMANA?

- Se continuará con el descapote de los parques 1 y 2
- Se continuará con la instalación de sardinel de los parques 2 y 3
- Se continuará la instalación de adoquín del parque 5
- Se continuará con las instalación de mampostería de las casetas comerciales de los parques 7 y 9
- Se fundirá la viga de cimentación del parque 3.



# En Sevilla Segunda etapa, pensamos en ti

## ¿Dónde está ubicado el proyecto?



Este parque se encuentra ubicado en la avenida 7° más conocida como la Avenida Sevilla, al frente de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Esta obra es una de las más importantes ejecutada por el área metropolitana de Cúcuta, ya que se encuentra ubicada en la comuna 5 colindando con cuatro barrios los cuales son: Pescadero, Sevilla, Zona Industrial y La Merced.



Faltan 42 días para terminar la ejecución



## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 																									
PROYECTO	ACTIVIDAD	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23				abr-23	may-23	jun-23		
		1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	53	57	62	66	67	68	69	70	71	75	80	
SEVILLA 2	ESTUDIOS Y DISEÑOS																								
	EJECUCIÓN DE OBRA																								
	ENTREGA																								

\*ESTE CRONOGRAMA ESTA PRESTO A SER MODIFICADO SEGÚN LA NECESIDAD DEL PROYECTO



Mediante el Otrosí No 05, firmado por el supervisor del contrato, se le otorgó una prórroga de 2 meses de ejecución más, a la fecha de terminación inicial del contrato.



INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA



## ¿ En qué se está trabajando ?



✓ Replanteo de camerinos.



✓ Construcción rampa principal.



✓ Se realizan actividades de posterrías.



✓ instalación de pasamanos.



✓ construcción de pozo de riego. h: 12,5 m



✓ Instalación de adoquín..

## ¿Qué haremos la próxima semana?

- Se iniciará con la construcción de camerinos.
- Se continuará con la construcción de rampas.



# ASÍ VAN NUESTRAS OBRAS ESPACIO PÚBLICO

[www.amc.gov.co](http://www.amc.gov.co)



**AMC**  Área Metropolitana  
de Cúcuta.



**ALCALDÍA  
DE SAN JOSÉ DE  
CÚCUTA**

