




# ASÍ VAN NUESTRAS OBRAS ESPACIO PÚBLICO

X  
X  
X

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 11 AL 17 DE MARZO

# ¡Renovación urbana Avenida Kennedy


## ¿DÓNDE ESTÁ UBICADO EL PROYECTO?

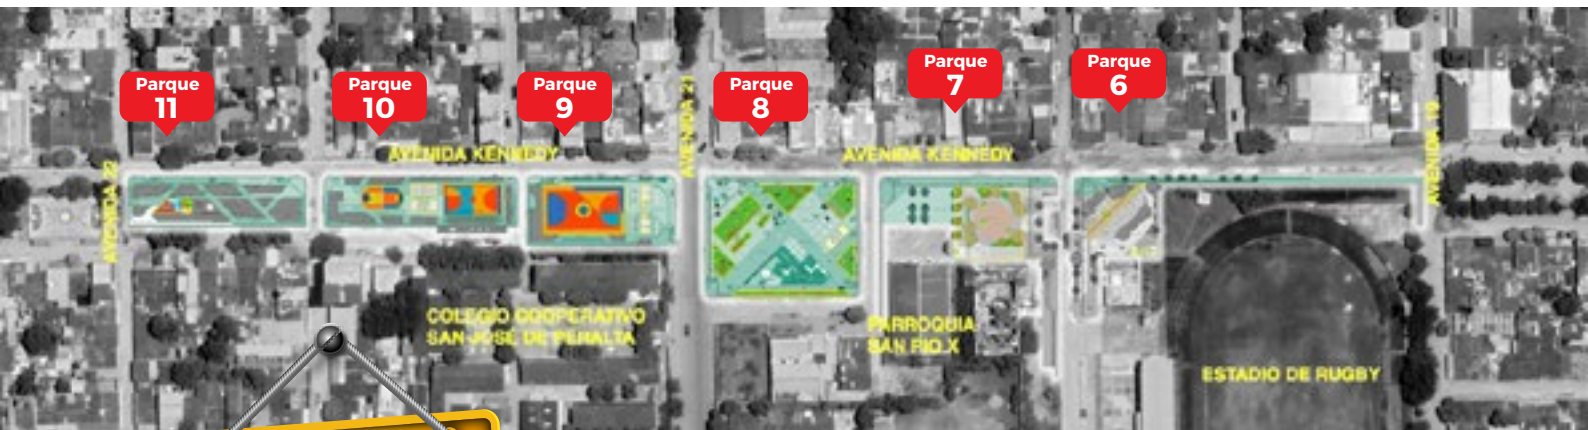


Faltan 49 días para  
terminar la ejecución



## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

<div><div><div>AMC.</div><div>Área Metropolitana de Cúcuta</div></div><div></div><div><div>CENTRO DE PENSAMIENTO URBANO</div></div></div>		AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA																							
		PROGRAMACION DE PROYECTOS																							
PROYECTO	ACTIVIDAD	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23				abr-23	may-23	jun-23		
		1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	53	57	63	67	68	69	70	71	72	76	81	
KENNEDY	ESTUDIOS Y DISEÑOS																								
	EJECUCIÓN DE OBRA																								
	ENTREGA																								

\*ESTE CRONOGRAMA ESTA PRESTO A SER MODIFICADO SEGÚN LA NECESIDAD DEL PROYECTO

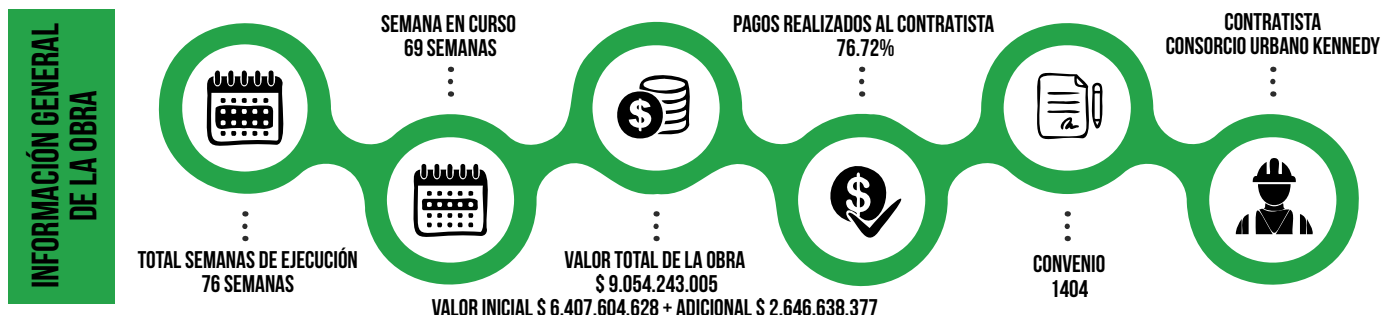

## ¿EN QUÉ SE ESTÁ TRABAJANDO?



✓ Se continúa con el relleno y nivelación del parque 1.



✓ Se realiza la adecuación de zonas verdes de los parques 1 y 2.



✓ Se continúa con el bordillo de confinamiento del parque 1.



✓ Se continúa con la fundida de rampas de acceso en los parque 4 y 5.



✓ Se termina de realizar las dilataciones en concreto de la cancha de fútbol de parque 3.



✓ Se termina de fundir la viga de cimentación del encerramiento de la cancha de futbol del parque 3.



✓ Se realiza la excavación para la cimentación de la pista de skatepark del parque 3.



✓ Se termina con la instalación de piso de adoquín del parque 5.

## PARQUES DEL 6 AL 11

Los parques contratados inicialmente cuentan con un avance de ejecución del 94,72%. Estos parques fueron diseñados para suplir la necesidad de la comunidad de la comuna 8.



- ✓ Se continúa con la instalación de mampostería de la caseta comercial del parque.

### ¿QUÉ SE HARÁ LA PRÓXIMA SEMANA?

- Se continuará con el descapote de los parques 1
- Se continuará con la instalación de sardinel de los parques 2 y 3
- Se continuará la instalación de adoquín del parque 3 y 4
- Se continuará con la instalación de mampostería de las casetas comerciales de los parques 7
- Se continuará fundiendo la viga de cimentación del parque 3.





# En Sevilla Segunda etapa, pensamos en ti

## ¿Dónde está ubicado el proyecto?


Este parque se encuentra ubicado en la avenida 7° más conocida como la Avenida Sevilla, al frente de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Esta obra es una de las más importantes ejecutada por el área metropolitana de Cúcuta, ya que se encuentra ubicada en la comuna 5 colindando con cuatro barrios los cuales son: Pescadero, Sevilla, Zona Industrial y La Merced.



Faltan 28 días para terminar la ejecución




## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

<div><div><div>AM</div><div>Área Metrc de Cúcuta</div></div><div></div><div>CENTRO DE PENSAMIENTO URBANO</div></div>																										
PROYECTO	FASE	ACTIVIDAD	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23					abr-23	may-23	jun-23	
			1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	53	57	62	66	67	68	69	70	71	75	80	
SEVILLA 2	1	ESTUDIOS Y DISEÑOS																								
	2	EJECUCIÓN DE OBRA																								
	3	ENTREGA																								

\*ESTE CRONOGRAMA ESTA PRESTO A SER MODIFICADO SEGÚN LA NECESIDAD DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

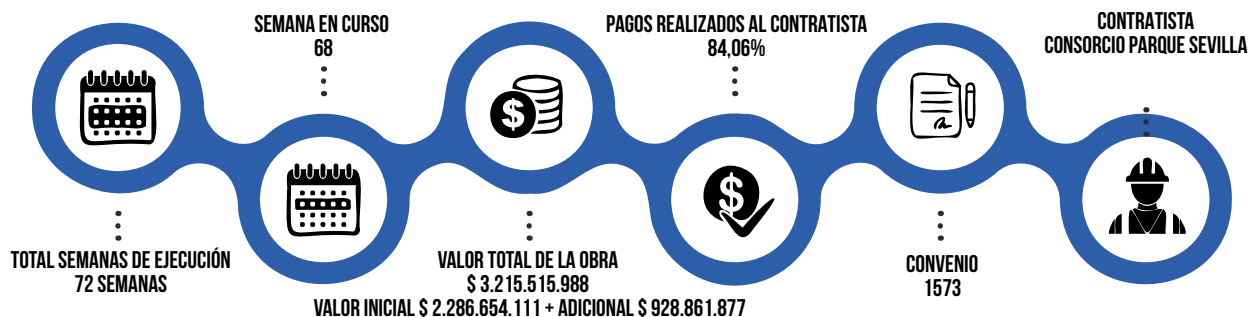

## ¿ En qué se está trabajando ?



✓ Restauración puente existente.



✓ Excavación zapatas camerinos.



✓ Excavación pedestales y fundida pedestales.



✓ Instalación adoquín puente existente.



✓ Instalación de aparatos sanitarios de caseta.



✓ Instalación de postería eléctrica.



✓ instalación jardineras zona 3.



✓ Fundida rampa para discapacitados.



✓ Antepiso puente existente.

## ¿Qué haremos la próxima semana?

- Sellado y dilataciones rampa.
- Pintura y demarcación parqueadero (topellantas)
- Instalación red sanitaria camerino.
- Fundida placa cimentación camerino.
- Tirada de trenzado para luminarias y casetas ( alumbrado público a parque)

# ASÍ VAN OBRAS NUESTRAS ESPACIO PÚBLICO

[www.amc.gov.co](http://www.amc.gov.co)



**AMC.**  Área Metropolitana  
de Cúcuta.



**ALCALDÍA  
DE SAN JOSÉ DE  
CÚCUTA**

